


Fundo Zapallar — validación mensual: medidor ESVAL, Matriz y Estanque Inferior

WES día completo (00:00–24:00 Chile, ambos días de lectura inclusive). La matriz principal llena el estanque inferior: deberían medir casi igual ($\pm 15\%$). Inf/Matriz vs medidor turbina ESVAL: $\pm 5\%$ = cuadra, $\pm 15\%$ = cerca.

Mes (ciclo ESVAL)	Ciclo lectura	Medidor ESVAL (m³)	Matriz WES (m³)	Estanque Inf. (m³)	Inf vs ESVAL	Matriz vs ESVAL	Inf vs Matriz	Inf ≈ Matriz	Inf ≈ ESVAL
Sep-25	28/08–27/09/25	3.375	3.317,6	3.080,8	-294,2 (−8,7%)	-57,4 (−1,7%)	-236,8 (−7,1%)	SI	cerca
Oct-25	27/09–29/10/25	3.973	4.217,7	4.397,1	424,1 (+10,7%)	244,7 (+6,2%)	179,3 (+4,2%)	SI	cerca
Nov-25	29/10–28/11/25	5.711	5.838,7	5.217,7	-493,3 (−8,6%)	127,7 (+2,2%)	-621 (−10,6%)	SI	cerca
Dic-25	28/11–30/12/25	6.319	6.530,2	5.543,5	-775,5 (−12,3%)	211,2 (+3,3%)	-986,8 (−15,1%)	NO	cerca
Ene-26	30/12/25–30/01/26	7.193	7.478,8	6.341,4	-851,6 (−11,8%)	285,8 (+4%)	-1.137,5 (−15,2%)	NO	cerca
Feb-26	30/01–27/02/26	6.478	5.857,8	6.755,5	277,5 (+4,3%)	-620,2 (−9,6%)	897,7 (+15,3%)	NO	SI
Mar-26	27/02–30/03/26	6.793	1.905,7	12.228	5.435 (+80%)	-4.887,3 (−72%)	10.322,2 (+541,6%)	NO	NO
Abr-26	30/03–29/04/26	6.034	3.113,4	9.172,9	3.138,9 (+52%)	-2.920,6 (−48,4%)	6.059,4 (+194,6%)	NO	NO
May-26	29/04–29/05/26	4.566	3.332,5	3.056,1	-1.509,9 (−33,1%)	-1.233,5 (−27%)	-276,4 (−8,3%)	SI	NO
Jun-26	29/05–27/06/26	3.707	2.481,5	3.055,2	-651,9 (−17,6%)	-1.225,5 (−33,1%)	573,7 (+23,1%)	NO	NO
Jul-26	27/06–29/07/26	5.067	3.316,9	2.433,1	-2.633,9 (−52%)	-1.750,1 (−34,5%)	-883,8 (−26,6%)	NO	NO
Ago-26	29/07–28/08/26	2.079	1.804,1	1.676,3	-402,7 (−19,4%)	-274,9 (−13,2%)	-127,8 (−7,1%)	SI	NO
TOTAL 12 meses		61.295	49.195	62.957,4	1.662,4 (+2,7%)	-12.100 (−19,7%)	13.762,4 (+28%)		
TOTAL sin transición	10 ciclos	48.024	41.431,5	43.974	-4.050 (−8,4%)	-6.592,5 (−13,7%)	2.542,4 (+6,1%)		

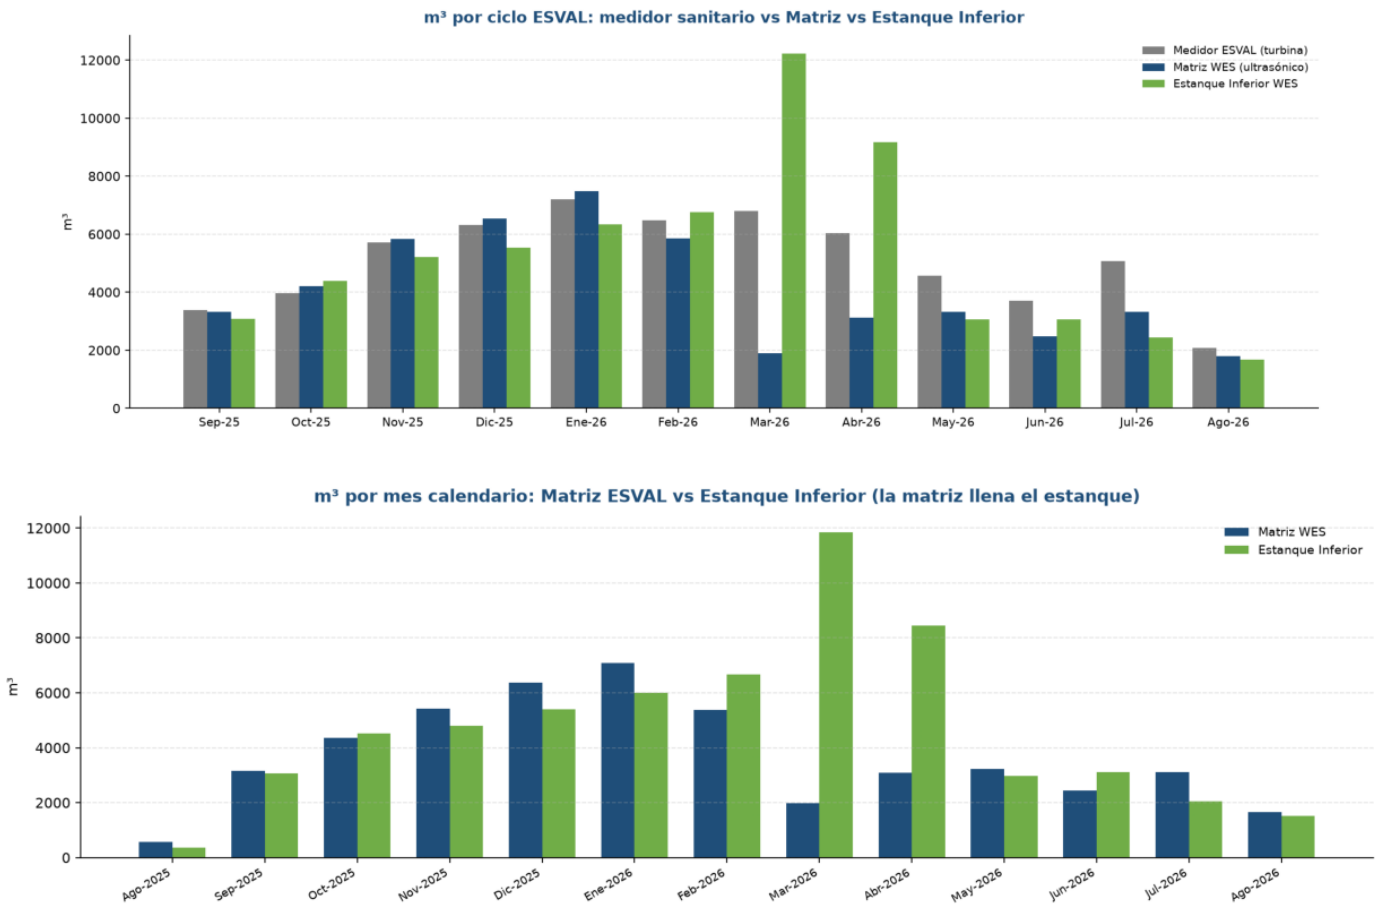

Filas rosadas = ciclos de transición (desconexión 25/02/2026 e instalación ultrasónico 11/03/2026): ahí la matriz no es comparable. El gráfico inferior es mes calendario (solo WES).
