

Informe de gestión hídrica — corte total

Club House CDUC · corte total 17/09 15:00 → reposición indicada 29/09 06:00 · telemetría al 21/09/2026 15:00

ESCALA DE ESTADO HÍDRICO		CLASIFICACIÓN ACTUAL: EN OBSERVACIÓN	
BAJO CONTROL Consumo estable	EN OBSERVACIÓN Requiere seguimiento	REQUIERE ATENCIÓN Revisión y decisión	CRÍTICO Acción inmediata
Motivo del periodo: el corte total funcionó (0 m³ por 65 h), pero la reposición telemedida es el 20/09 y no el 29/09 06:00 indicado			
29,7 m³ Sin corte (65 h previas)	0,0 m³ Con corte (65 h a cero)	29,7 m³ Ahorro (100,0 %)	\$41.538 Ahorro @ 1.400 CLP/m³

Lectura ejecutiva

Se programó corte total en **Club House CDUC (000021-01)** el jueves **17/09/2026 a las 15:00**, con reposición indicada el **29/09/2026 a las 06:00**. El 17/09 de 07:00 a 13:00 aún hubo consumo (**5,3 m³**); desde las 15:00 el medidor quedó en cero.


Ventana efectiva a cero: **17/09 15:00 – 20/09 08:00** → 0,0 m³ en 65 h. Periodo equivalente previo: **29,7 m³** (\$41.538). Ahorro: **100,0 %** → **\$41.538**.

Estado: En observación — el control hidráulico del corte funcionó; hay que cuadrar la fecha de reposición (20/09 telemedida vs 29/09 indicada).

Cómo leer este informe: la portada es el antes/después del tramo en que el medidor estuvo en cero (17/09 15:00 a 20/09 08:00), valorizado a 1.400 CLP/m³. El gráfico diario muestra también la reposición del 20/09. El anexo técnico detalla solo la ventana a cero.

Hallazgos prioritarios


PRIORIDAD	HALLAZGO	LECTURA Y DECISIÓN
INFORMATIVA	El corte total dejó el Club House en 0,0 m³ durante 65 h Programado el jueves 17/09 a las 15:00. Desde esa hora hasta las 07:00 del domingo 20/09 el medidor 000021-01 registró 0,0 m³ (65 horas). El 18 y el 19 de septiembre (Fiestas Patrias) fueron cero las 24 h.	En las 65 horas inmediatamente anteriores (14/09 22:00 a 17/09 15:00) el mismo punto consumió 29,7 m³. Ahorro del tramo a cero: 29,7 m³ (100,0 %) = \$41.538.
ATENCIÓN	La reposición se observa el 20/09 ~08:00, no el 29/09 06:00 Lo indicado para este informe: corte total desde el 17/09 15:00 y suministro de vuelta el 29/09 a las 06:00. La telemetría muestra el primer caudal el domingo 20/09 a las 08:00 (1,0 m³/h) y 24,4 m³ entre esa hora y el cierre del informe (21/09/2026 15:00).	Conviene confirmar con operación si la fecha de reapertura era el 20/09 o el 29/09. Si el corte debía mantenerse hasta el 29/09 06:00, el consumo del 20 y 21/09 está dentro de la ventana programada.
INFORMATIVA	No hay consumo nocturno (00:00–06:59) en lo que va de septiembre Entre el 1 y el 21/09 el Club House no registra m³ en madrugada. El residual del recinto es diurno. Eso respalda que el cero del 17–20/09 es corte de válvula, no un medidor caído: el 17/09 de 07:00 a 13:00 aún hubo 5,3 m³ y después de las 15:00 quedó en cero.	La red entra en cero cuando se programa el corte; no aparece fuga nocturna de fondo.
INFORMATIVA	Tras la reapertura el recinto volvió a consumir en horario diurno 20/09: 8,0 m³ (desde las 08:00). 21/09 (parcial al cierre): 16,9 m³. Valorizado al cierre: \$34.118.	Patrón coherente con uso del Club House, no con un pulso anómalo.

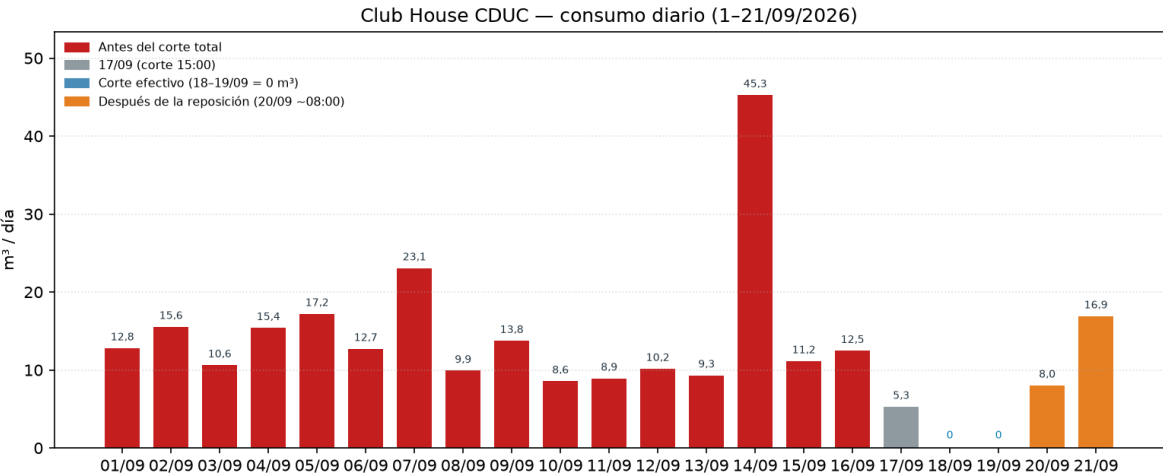

Cómo leer este gráfico: Rojo = días previos al corte. Gris = 17/09 (corte a las 15:00). Azul = 18–19/09 en cero. Naranja = desde el 20/09, cuando volvió el caudal.

En las 65 h previas el Club House registró 29,7 m³; en las 65 h de corte efectivo, 0,0 m³.

Consumo nocturno y plan de acción

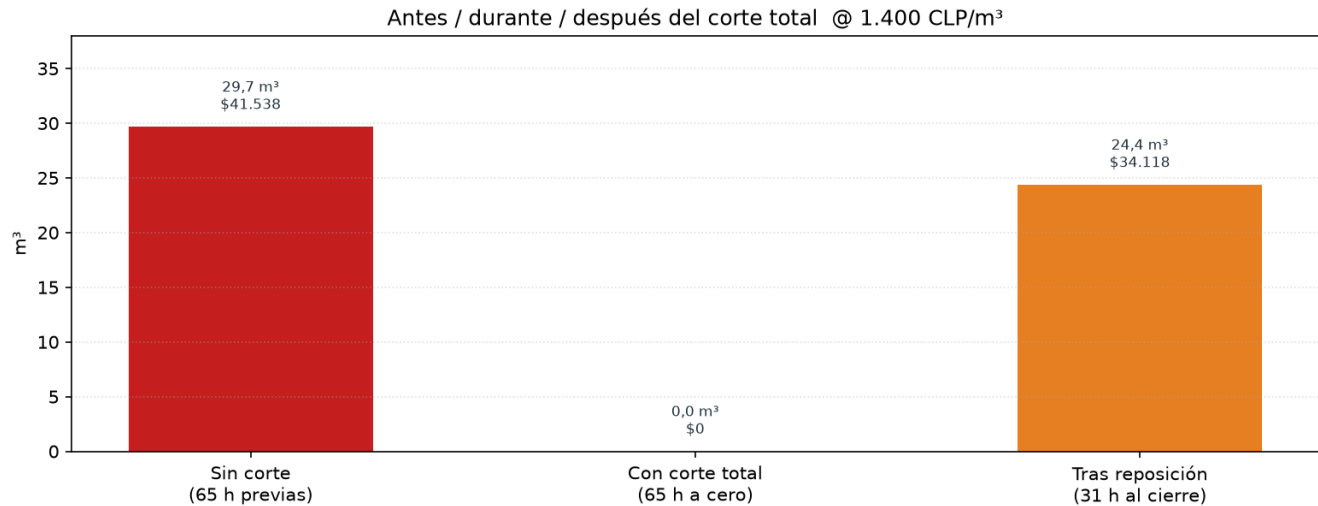

Tres bloques de igual lectura operativa: horas equivalentes antes del corte, horas en cero, y horas desde la reposición observada hasta el cierre del informe.

Acciones recomendadas

ACCIÓN	RESPONSABLE SUGERIDO	PLAZO	RESULTADO ESPERADO
Confirmar la fecha/hora real de reposición programada (20/09 vs 29/09 06:00)	WES + CDUC	48 h	Dejar por escrito el calendario de corte total y evitar lecturas cruzadas.
Si el corte debía durar hasta el 29/09, revisar quién habilitó el suministro el 20/09 ~08:00	WES + operación Club House	Esta semana	Determinar si fue reapertura acordada o habilitación anticipada.
Registrar en bitácora los próximos cortes totales (inicio, fin y excepciones)	WES	Continuo	Que una reapertura no se confunda con fuga ni con pérdida de control.

Conclusión

Conclusión: el corte total del Club House se ejecutó. **Se evitaron 29,7 m³ (\$41.538)** frente a las horas equivalentes inmediatamente anteriores, con la red en cero el 18 y 19/09.

Pendiente: confirmar si la reposición programada era el 20/09 o el 29/09 06:00. Telemetría: caudal desde el 20/09 08:00 (24,4 m³ al cierre).

Anexo técnico - indicadores por punto

PUNTO	TOTAL	PROMEDIO	MÁXIMO DIARIO	NOCTURNO	COBERTURA NOCHE
Club House CDUC	0,0 m³	0,0 m³/día	0,0 m³ · 17/09	0,0 m³	4 días

Criterio nocturno y costo referencial

Tarifa referencial WES (igual a CORMUP vacaciones): **\$1.400/m³**. El ahorro económico = (m³ del tramo equivalente previo – m³ del tramo en cero) × tarifa. No sustituye la factura del sanitario.

Nocturno Club House: horas Chile 00:00–06:59 (criterio operativo WES fuera de colegios CORMUP). En esta serie el nocturno es 0,0 m³.

Anexo: TOTAL / PROMEDIO / MÁXIMO / NOCTURNO corresponden solo a la ventana en cero (17/09 15:00–20/09 08:00). Para el antes/después y la reposición use la portada y el gráfico diario.
