


Clínica Bupa Antofagasta — Seguimiento de proyección WES

Periodo actualizado: 23/07/2026 – 03/08/2026 (12 días civiles completos).

Referencia: reporte previo 23–27/07/2026 (proyección ~7.498,7 m³ / 30 días).

VEREDICTO: ¿CONTINÚA LA PROYECCIÓN?

La proyección previa NO se sostiene al mismo ritmo. En 23–27/07 el Medidor Principal Sanitaria promedió 250 m³/día (proyección 7.498,7 m³ / \$20.761.364). Con data actualizada (12 días) el promedio bajó a 169,6 m³/día (por debajo en 80,4 m³/día; proyección actualizada 5.089,2 m³ / \$14.090.337, 2.409,4 m³ menos que la proyección previa). En el tramo reciente (2026-07-28 a 2026-08-03, 7 días) el ritmo es aún más bajo: 112,3 m³/día (proyección 3.368,2 m³ / 30 días; 137,7 m³/día bajo el baseline).

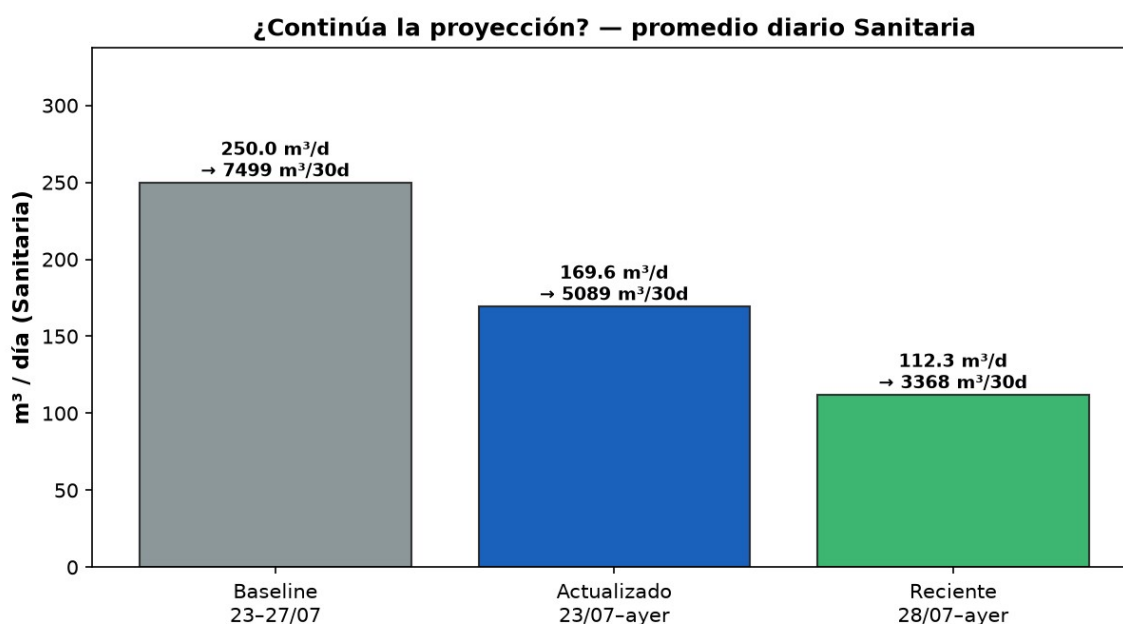

COMPARACIÓN DE PROYECCIONES (MEDIDOR PRINCIPAL SANITARIA)

PROYECCIONES SANITARIA

Escenario	Días	Promedio diario (m³)	Proyección 30 días (m³)	Proyección 30 días (CLP)	Vs baseline
-----------	------	----------------------	-------------------------	--------------------------	-------------

Baseline (reporte 23-27/07)	5	250	7.498,7	\$20.761.364	—
Actualizado (23/07-03/08)	12	169,6	5.089,2	\$14.090.337	-80,4 m ³ /día
Solo reciente (desde 28/07)	7	112,3	3.368,2	\$9.325.317	-137,7 m ³ /día
Referencia: factura julio	—	—	6.696	\$18.538.860	histori ca


CONSUMO DÍA A DÍA — ¿BAJÓ O AUMENTÓ?

Referencia de la proyección previa: 250 m³/día en Sanitaria. Se indica si cada día bajó o aumentó respecto a ese ritmo y respecto al día anterior. También se muestra la suma de las tres salas de bomba del mismo día.

SERIE DIARIA SANITARIA

Fecha	Sanitaria (m ³)	Vs proyección	Δ vs proy. (m ³)	Vs día ant.	Salas bomba (m ³)
23/07/2026	255,1	aumentó	5,1	—	51,5
24/07/2026	256,2	aumentó	6,2	aumentó (1,2)	54,4
25/07/2026	240,9	bajó	-9,1	bajó (-15,3)	40,6
26/07/2026	244,6	bajó	-5,4	aumentó (3,7)	42,1
27/07/2026	252,9	estable	2,9	aumentó (8,3)	50,6
28/07/2026	221,4	bajó	-28,6	bajó (-31,5)	65,1
29/07/2026	108,2	bajó	-141,8	bajó (-113,2)	65,9
30/07/2026	98,6	bajó	-151,4	bajó (-9,6)	55,9
31/07/2026	95,2	bajó	-154,8	bajó (-3,4)	54,9
01/08/2026	88,1	bajó	-161,9	bajó (-7,1)	56,1
02/08/2026	77,1	bajó	-172,9	bajó (-11)	48,5
03/08/2026	97,3	bajó	-152,7	aumentó (20,3)	63,6

Lectura: de 12 días completos, 9 quedaron bajo la proyección previa, 2 por encima y 1 estables (± 5 m³). El quiebre es claro desde el 28/07: en los 7 días posteriores al baseline, Sanitaria promedió 112,3 m³/día (frente a 250 m³/día). Mínimo del periodo: 77,1 m³ (2026-08-02); máximo: 256,2 m³ (2026-07-24).

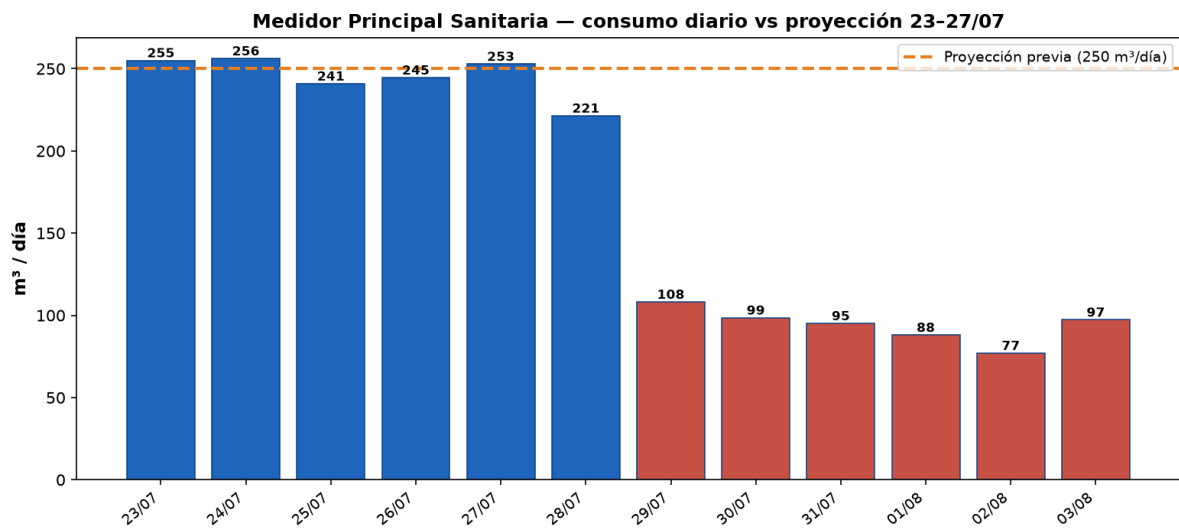


PROYECCIÓN MENSUAL ACTUALIZADA (WES · DÍAS COMPLETOS)

Promedio diario de 12 días completos (23/07/2026–03/08/2026) × 30. Tarifa efectiva factura julio: \$2.769 CLP/m³. La factura (6.696 m³ / \$18.538.860) es solo referencia histórica.

PROYECCIÓN / CUENTA MENSUAL ACTUALIZADA

Punto	Consumo 12 días (m³)	Promedio diario (m³)	Proyección 30 días (m³)	Proyección 30 días (CLP)
Medidor Principal Sanitaria (000029-09)	2.035,7	169,6	5.089,2	\$14.090.337
Sala de Bomba Principal (000029-07)	562,1	46,8	1.405,3	\$3.890.918
Sala de Bomba Sexto Piso (000029-08)	75	6,2	187,4	\$518.775
Sala de Bomba N°2 (000029-10)	12,3	1	30,8	\$85.205
Referencia: factura julio (histórica)	—	—	6.696	\$18.538.860

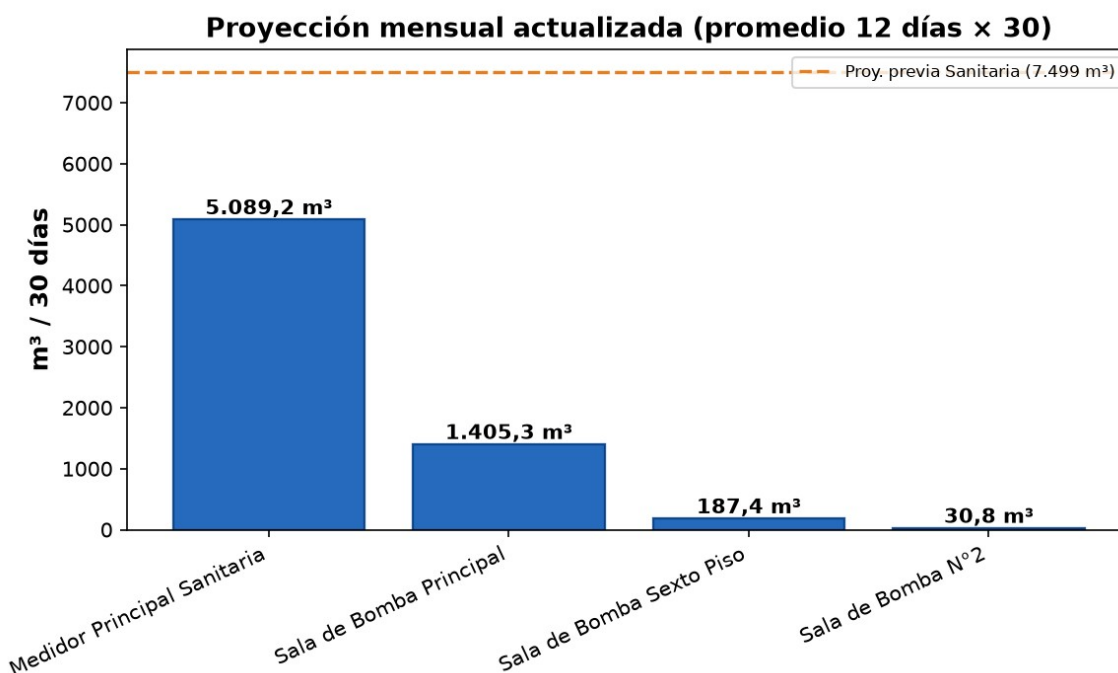

PARTICIPACIÓN SALAS VS CUENTA (PROYECCIÓN ACTUALIZADA)


Sanitaria = 100% de la cuenta. Las salas son submediciones. El diferencial es volumen no monitoreado punto a punto. En el baseline era ~80,9% no monitoreado; con data actualizada queda en 68,1%.

PARTICIPACIÓN ACTUALIZADA

Concepto	Proy. 30 días (m³)	Proy. 30 días (CLP)	% sobre Sanitaria
Medidor Principal Sanitaria (cuenta / 100%)	5.089,2	\$14.090.337	100,0%
Sala de Bomba Principal (000029-07)	1.405,3	\$3.890.918	27,6%
Sala de Bomba Sexto Piso (000029-08)	187,4	\$518.775	3,7%
Sala de Bomba N°2 (000029-10)	30,8	\$85.205	0,6%
TOTAL salas de bomba (07+08+10)	1.623,5	\$4.494.898	31,9%
NO MONITOREADO (Sanitaria – salas)	3.465,8	\$9.595.438	68,1%

Nota operativa: mientras Sanitaria cayó de ~250 a ~112 m³/día, las salas de bomba pasaron de ~47,9 a ~58,6 m³/día. Conviene validar en terreno/telemetría si el descenso de Sanitaria es real (fuga corregida, cambio operativo) o un problema de medición, dado que las submediciones internas no acompañan la misma caída.

DÍA CON MAYOR CONSUMO NOCTURNO — SANITARIA (24-07-26)

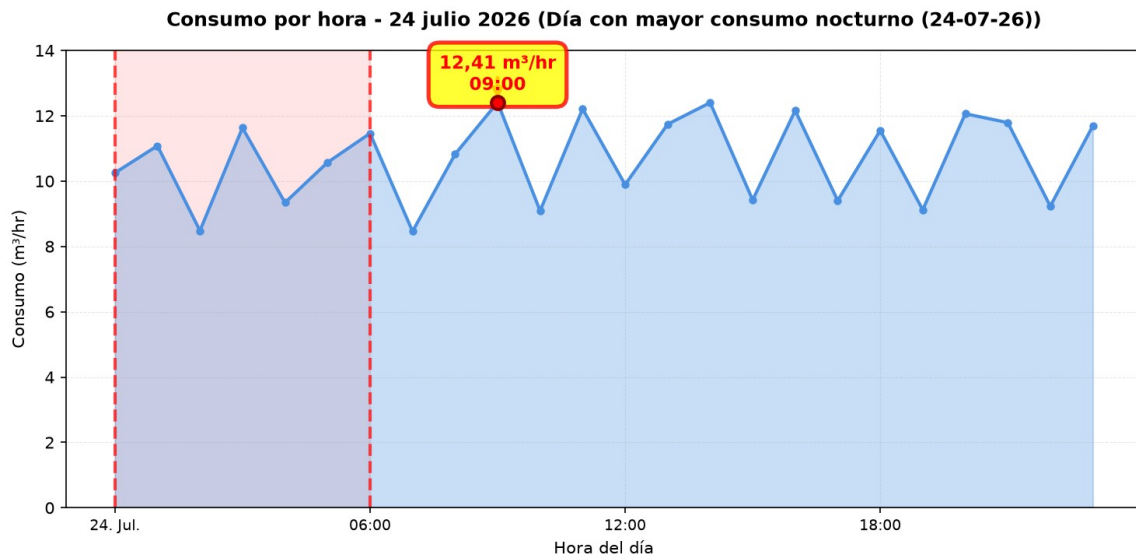

CONCLUSIONES

- La proyección del reporte 23–27/07 ($\sim 7.499 \text{ m}^3$ / $\sim \$20.761.364$) ya no se sostiene: promedio actualizado $169,6 \text{ m}^3/\text{día} \rightarrow 5.089,2 \text{ m}^3$ a 30 días.
- Día a día: caída marcada desde el 28/07; tramo reciente $112,3 \text{ m}^3/\text{día}$ (proyección $3.368,2 \text{ m}^3$).
- Participación salas: de 19,1% a 31,9% de la cuenta proyectada; no monitoreado de 80,9% a 68,1%.
- Revisar coherencia Sanitaria vs salas de bomba: el descenso de la cuenta no se refleja en las submediciones internas.
