

Reporte Agregado - BUPA

MONITOREO WES

Análisis consolidado de 4 puntos de monitoreo

Rango: 23-07-26 - 11-08-26

Generado: 13-08-26

RESUMEN EJECUTIVO AGREGADO


Puntos de monitoreo analizados: 4.

Consumo total agregado: 4.027,2 m³.

Consumo promedio por punto: 1.006,8 m³.

COMPARACIÓN DE CONSUMO POR PUNTO

Consumo acumulado de cada punto en el periodo (suma de todos los días analizados).

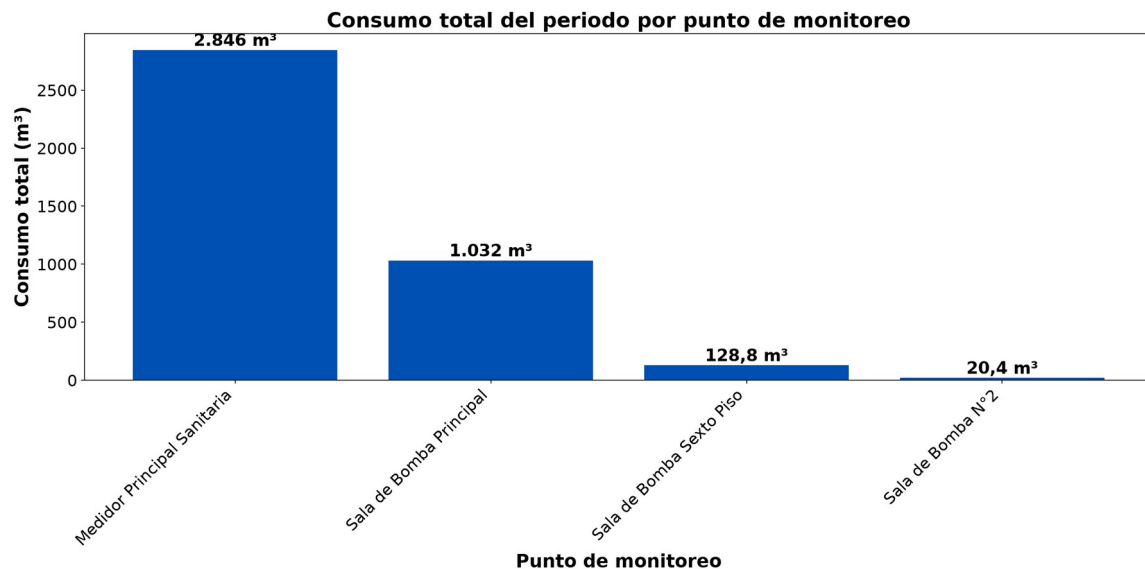


Bupa Antofagasta registró un consumo total de 4.027,2 m³ en el periodo entre 4 puntos de monitoreo. Los de mayor demanda fueron: Medidor Principal Sanitaria (2.846 m³, 70,7 %), Sala de Bomba Principal (1.032 m³, 25,6 %), Sala de Bomba

Sexto Piso (128,8 m³, 3,2 %). El menor consumo correspondió a Sala de Bomba N°2 (20,4 m³, 0,5 % del total).


EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DIARIO POR PUNTO

Evolución del consumo diario (m³) de cada punto en el periodo. Solo la curva de consumo.


SALA DE BOMBA PRINCIPAL

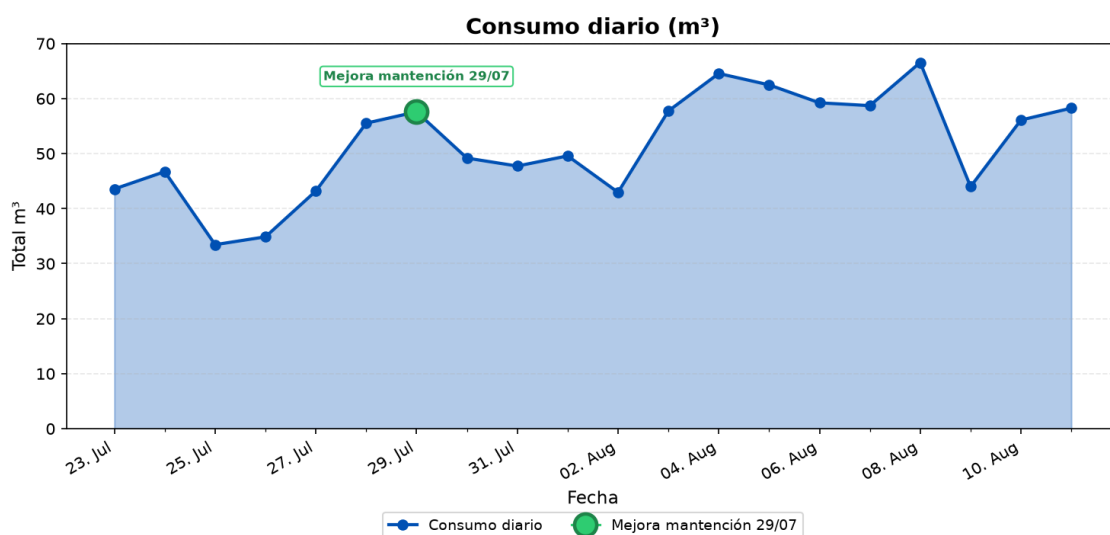


SALA DE BOMBA SEXTO PISO

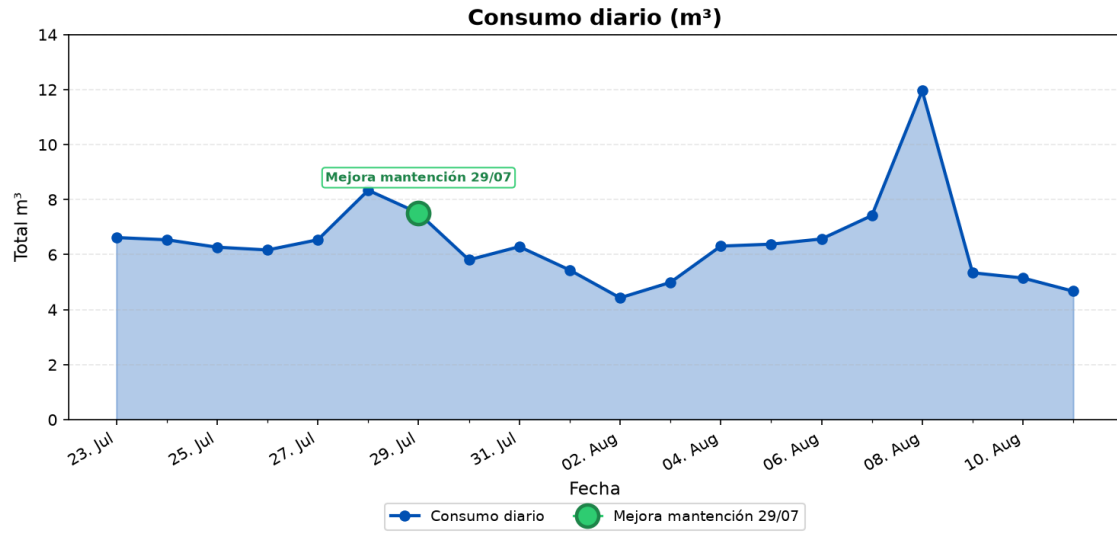

MEDIDOR PRINCIPAL SANITARIA

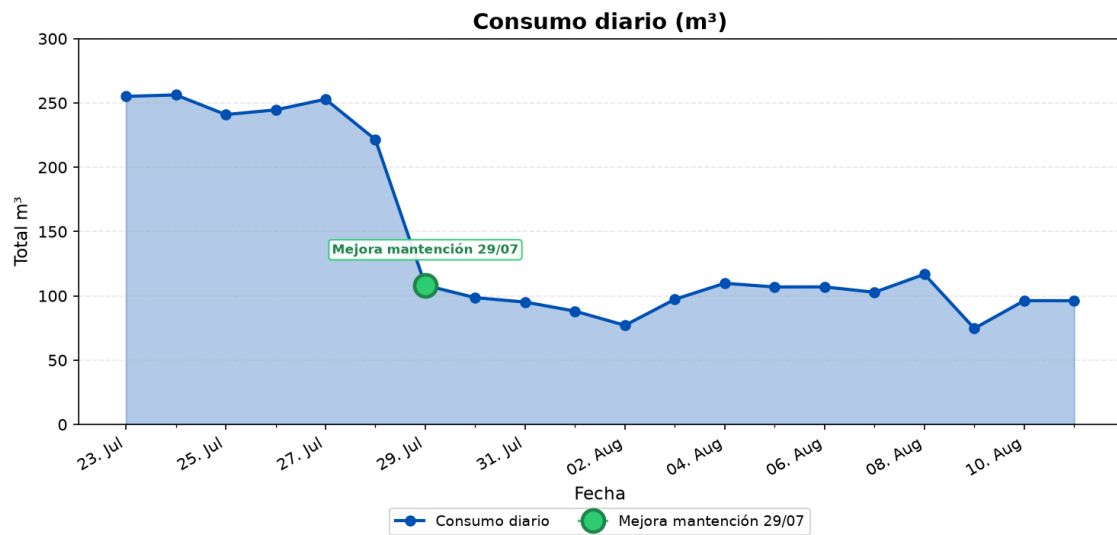

SALA DE BOMBA N°2

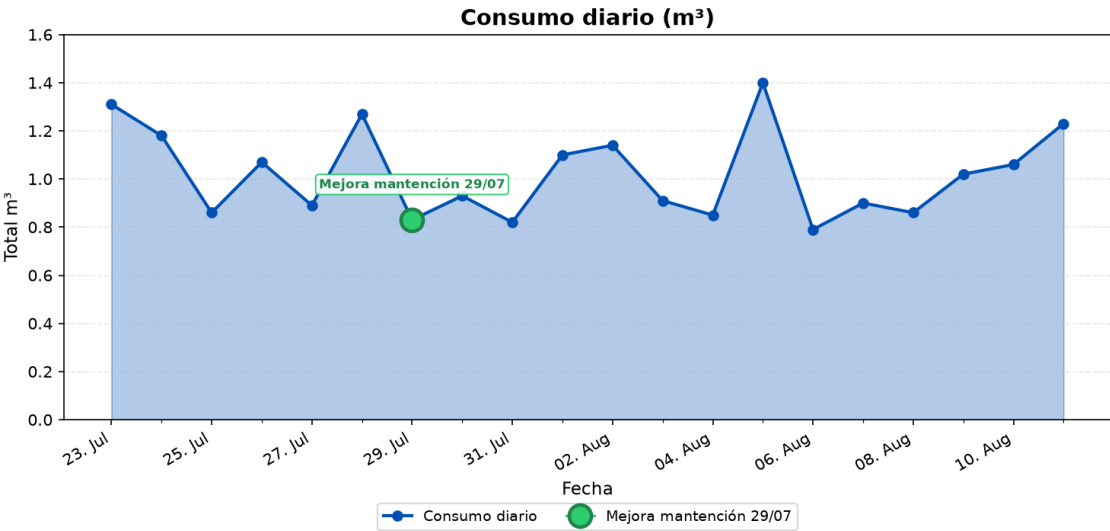


RESUMEN POR PUNTO DE MONITOREO

MÉTRICAS POR PUNTO

Ranking	Dispositivo	Consumo total (m³)	Consumo nocturno	Costo nocturno (CLP)
1	Medidor Principal Sanitaria	2.846	687 m³ (20 días, 100%)	\$893.087
2	Sala de Bomba Principal	1.032	198 m³ (20 días, 100%)	\$257.361
3	Sala de Bomba Sexto Piso	128,8	31,5 m³ (20 días, 100%)	\$40.924
4	Sala de Bomba N°2	20,4	5,4 m³ (20 días, 100%)	\$7.020
	TOTAL	4.027,2	921,8 m³	\$1.198.392

ANÁLISIS DE CONSUMOS NOCTURNOS

Horario nocturno considerado: Se define como consumo nocturno el volumen medido entre las 00:00 y las 06:59 (hora Chile), es decir 7 horas por cada día del periodo. El total nocturno es la suma de esas horas en todos los días con datos — no se extrapola ni proyecta a 30 días.

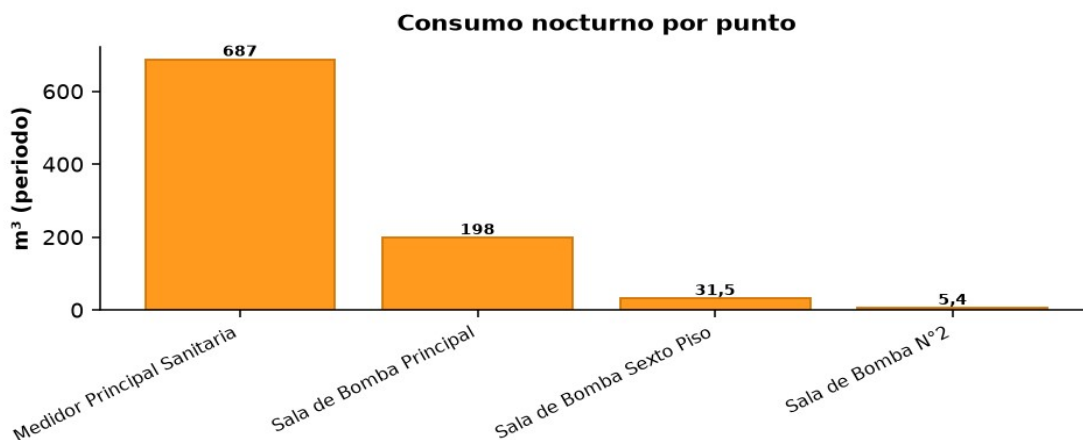

DETALLE POR PUNTO

Punto	m³ nocturnos	Días 00–06:59	Costo (CLP)
Medidor Principal Sanitaria	687	20	\$893.087
Sala de Bomba Principal	198	20	\$257.361
Sala de Bomba Sexto Piso	31,5	20	\$40.924
Sala de Bomba N°2	5,4	20	\$7.020
Total Bupa Antofagasta (periodo):	921,8		\$1.198.392


CONCLUSIÓN — CONSUMO NOCTURNO

Durante los 20 días del periodo, Bupa Antofagasta registró un total de 921,8 m³ en horario nocturno (Medidor Principal Sanitaria (687 m³), Sala de Bomba Principal (198 m³), Sala de Bomba Sexto Piso (31,5 m³) y 5,4 m³ en los demás puntos), equivalente a \$1.198.392 al precio de referencia del servicio. Ese volumen corresponde a agua consumida en madrugada cuando la operación debería ser mínima; un sistema de monitoreo y regulación WES permite detectar y reducir esos caudales, mejorando el control del recurso y el costo asociado.

COMPARATIVO DEL MES (NOCTURNO VS EFECTIVO)


Proyección a 30 días a partir del periodo (20 días): nocturno proyectado 1.382,8 m³ (\$1.797.588) y consumo efectivo 4.658,1 m³ (\$6.055.530).

Comparación mensual: Consumo nocturno vs Consumo efectivo

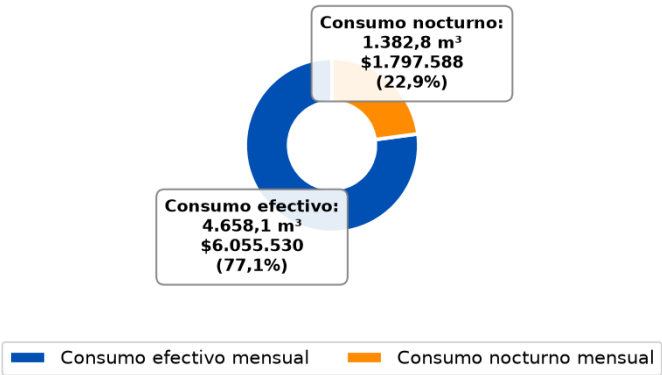

COMPARATIVO ÚLTIMOS 6 MESES

Consumo mensual del Medidor Principal Sanitaria (cuenta de agua de la clínica). Los meses marcados con * corresponden a tramos parciales del periodo de este reporte (desde 23/07/2026 hasta 11/08/2026). En el periodo, la cuenta registró 2.846 m³.

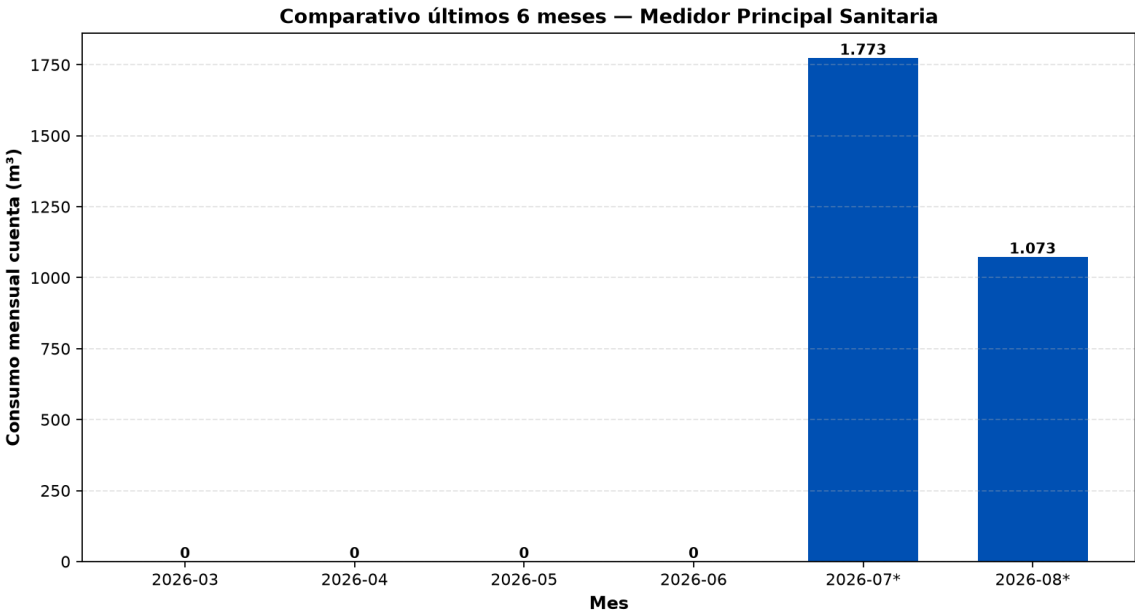

Mes	Cuenta Sanitaria (m³)
2026-03	0
2026-04	0
2026-05	0
2026-06	0

2026-07*	1.773,2
2026-08*	1.072,8

PROYECCIÓN DE CIERRE DE AGOSTO Y EFECTO DE LA MEJORA

Hito 29/07/2026: en los gráficos diarios (punto verde) se marca la fecha en que el consumo de la cuenta bajó de forma nítida. Ese día el Medidor Principal Sanitaria pasó de un ritmo cercano a 245,2 m³/día (promedio 23/07/2026–28/07/2026) a unos 98,2 m³/día (promedio 29/07/2026–11/08/2026), una reducción del orden del 60 %. Esta bajada se asocia a una mejora ejecutada por el equipo de mantención, a partir de la información de consumo que entrega WES.


PROYECCIÓN MENSUAL — CIERRE DE AGOSTO 2026

Para cerrar la cuenta de agosto se usa el consumo ya registrado (01/08–11/08/2026) y se proyectan los 20 días restantes al ritmo posterior a la mejora. En paralelo se muestra qué habría sido el mes si se hubiera mantenido el consumo previo a la intervención.

PROYECCIÓN / AHORRO AGOSTO

Concepto	m ³ / día	Base de cálculo	Total agosto (m ³)	Valorizado (CLP)
Ritmo antes de la mejora	245,2	23/07/2026–28/07/2026 (6 días)	7.601	\$9.881.829
Ritmo después de la mejora	98,2	29/07/2026–11/08/2026 (14 días)	—	—
Ya consumido en agosto	97,5	01/08–11/08/2026 (11 días)	1.073	\$1.394.666
Proyección cierre agosto (con mejora)	98	Observado + 20 días × ritmo post-mejora	3.037	\$3.947.829
Ahorro proyectado vs ritmo previo	—	Diferencia de cierre de mes	4.565	\$5.934.000

Lectura para el cliente: si el consumo se hubiera mantenido en ~245 m³/día, agosto habría cerrado cerca de 7.601 m³ (\$9.881.829). Con el ritmo actual post-mejora, el cierre proyectado es de ~3.037 m³ (\$3.947.829), es decir un ahorro del orden de 4.565 m³ (\$5.934.000) solo en este mes.

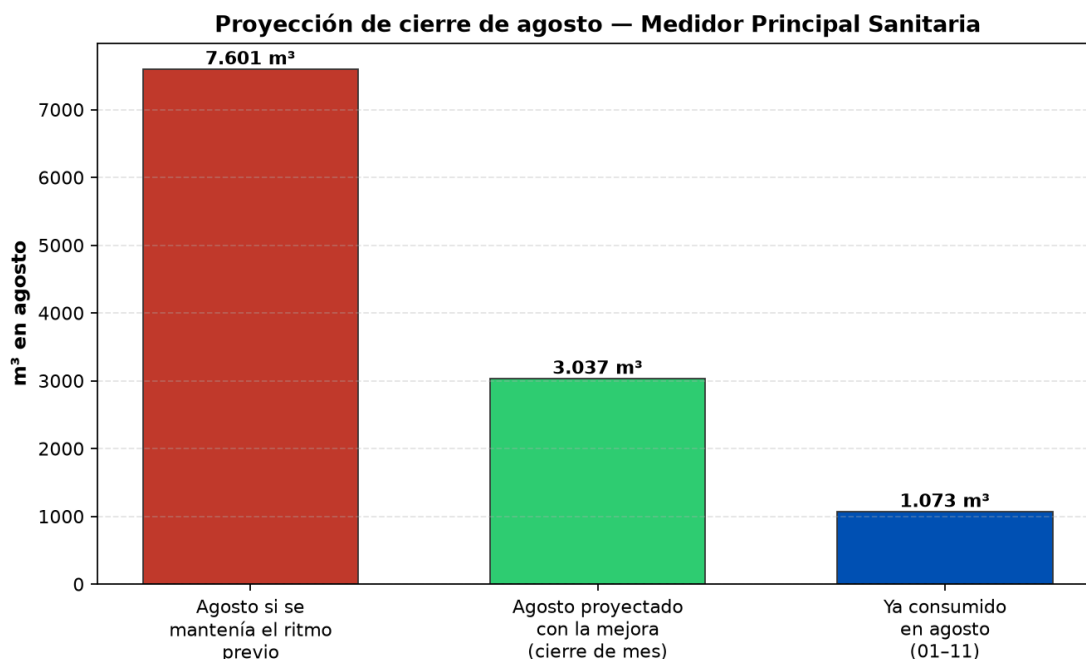

ROL DE WES Y DEL EQUIPO DE MANTENCIÓN

La información que entrega WES es clave para el equipo de mantención: permite ver en qué momento el consumo se disparó o se mantuvo alto, actuar con precisión y verificar de inmediato el efecto de las mejoras. En este caso, la bajada marcada el 29/07/2026 muestra que, cuando el equipo interviene apoyado en los datos de monitoreo, la clínica puede reducir de forma sustancial el volumen facturado y, con ello, la cuenta de agua. Mantener este seguimiento permite sostener el ahorro y detectar a tiempo cualquier nuevo desvío.
